

高砂埋立護岸整備 進捗状況 【令和7年7月末時点】

	工事名	工期
完了 工事	① R5(0 県)ケーソン製作工事	R6.2.20～R6.9.6
	② R5(0 県)ブロック製作工事	R6.2.26～R6.9.27
	③ R5(0 県)基礎工事	R6.3.6 ～R6.8.30
	④ R6 ブロック製作工事	R6.5.29～R7.3.31
	⑤ R6 基礎工事	R6.5.29～R7.5.30
	⑥ R6 ケーソン製作工事	R6.6.26～R7.1.20
	⑦ R6 ケーソン据付工事	R6.6.24～R7.1.31
	⑧ R6 ケーソン製作工事（2）	R6.10.1～R7.5.30
	⑨ R6(債務)根固ブロック製作工事	R6.11.29～R7.6.30
	⑩ R6(債務)ケーソン製作工事（南）	R7.1.17～R7.7.31
施工 中 工事	⑪ R6(債務)ケーソン据付工事（1）	R7.2.25～R7.9.30
	⑫ R6(債務)ケーソン据付工事（2）	R7.2.18～R7.10.31
	⑬ R6(債務)ケーソン据付工事（南）	R7.3.3～R7.10.31
	⑭ R6(債務)ケーソン製作工事（西）	R7.3.18～R7.10.31
	⑮ R6(債務)基礎工事	R7.3.24～R7.10.31
	⑯ R7 ケーソン据付工事（1）	R7.5.30～R7.11.28
	⑰ R7 ケーソン据付工事（2）	R7.6.6～R7.12.19
	⑱ R7 ケーソン製作工事（南）	R7.6.20～R8.3.31

高砂・仮置きヤード



電子地形図（国土地理院）
を加工して作成

令和7年8月8日

宮野浦・フローティングドック


凡例
【 】：作業状況

⑭ ケーソン6函
【鉄筋組立、
型枠組立】


⑮ ケーソン4函
【作業準備】

⑯ 仮置き完了

撮影方向 A

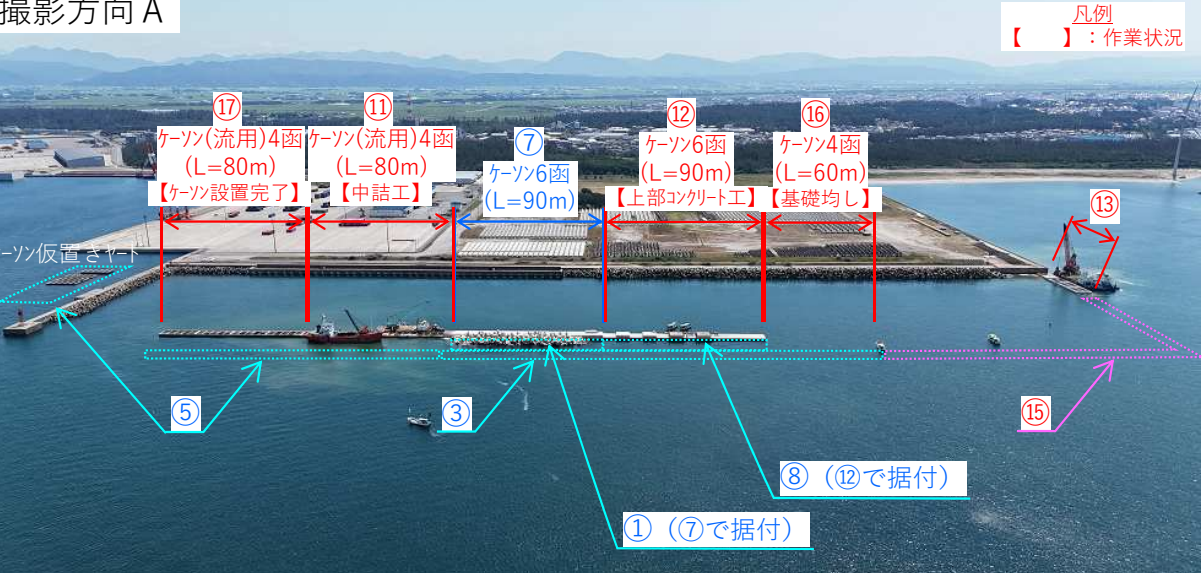


撮影方向 B

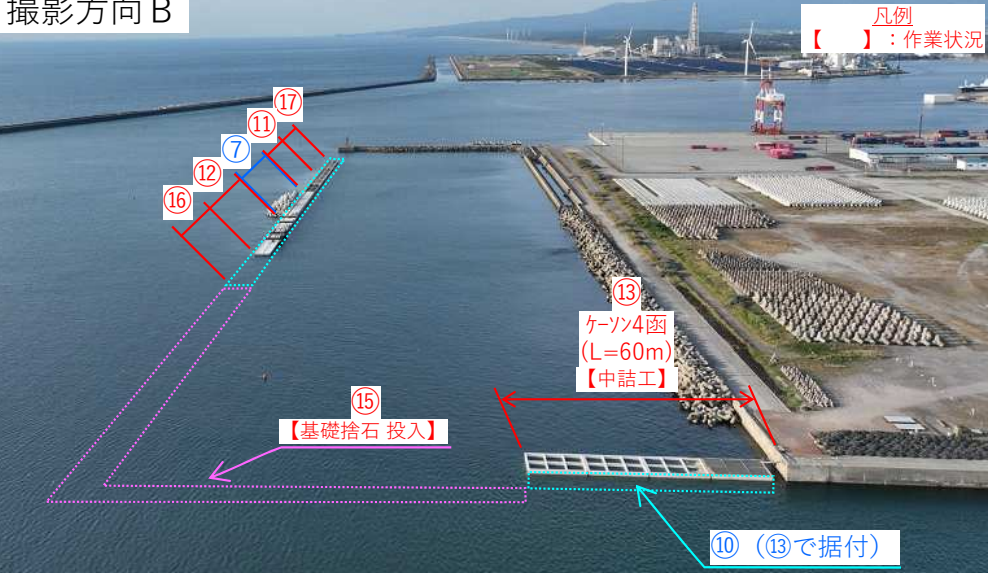

時系列変化

撮影方向A

撮影方向B

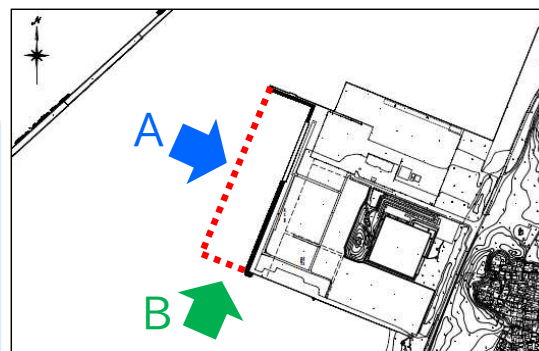

R6年8月末



R7年1月末(3月末まで状況変わらず)



R7年3月末



9月末



4月末



4月末



10月末



5月末



5月末



11月末



6月末



6月末



12月末



7月末



7月末

